

第一筏川大橋補修その他工事（第2貯木場地骨橋） 工事概要

工事概要

工事名： 第一筏川大橋補修その他工事（第2貯木場地骨橋）
工事場所： 愛知県海部郡飛鳥村木場1丁目地先、2丁目地先、西浜地先
工期： 令和06年08月24日 ～ 令和07年03月21日
 ※ 本施工開始については、令和06年09月30日（月）を予定しております。
 ※ 原則として、土曜日・日曜日及び正月休暇を休日とします。
 ※ 作業時間については、08:00～17:00とし、夜間作業は行いません。
 ※ 施工期間中は桁下の通航が不可となります。

工事内容： 橋梁の塗装塗り替え

発注者： 名古屋港管理組合

主任現場監督員 子安 誠
 現場監督員 平木 寿典 TEL 052-384-6013


受注者： ヤマダイインフラテクノス株式会社

住所 東海市名和町二番割中5番地の1
 TEL 052-604-1017
 現場代理人・監理技術者 高木 敏男 携帯番号 080-8259-6176

規制方法・期間

- 施工に先立ち、足場組み立てや資材運搬等の作業を行います。
- 右図の平面図（規制イメージ）のように地骨橋南北の道路を規制させていただきます。
- 車両通行止め（歩行者は通行可能）は、令和06年10月02日頃から1ヶ月間程度を予定しております。また、11月下旬ごろの仮設工解体時にも2～3日程度予定しております。
- 車両・歩行者通行止めは、令和06年10月02日頃から2ヶ月間程度を予定しております。
（上記の期間は基本的には通行止めですが、必要な場合は現場代理人・監理技術者にお尋ねください。）
- 研削材及びケレンかすを回収したドラム缶は令和7年1月頃に回収予定です。
（貯木場内を通行する車両の邪魔にならないよう現場内にフェンス等で囲い保管します。）

平面図（規制イメージ）

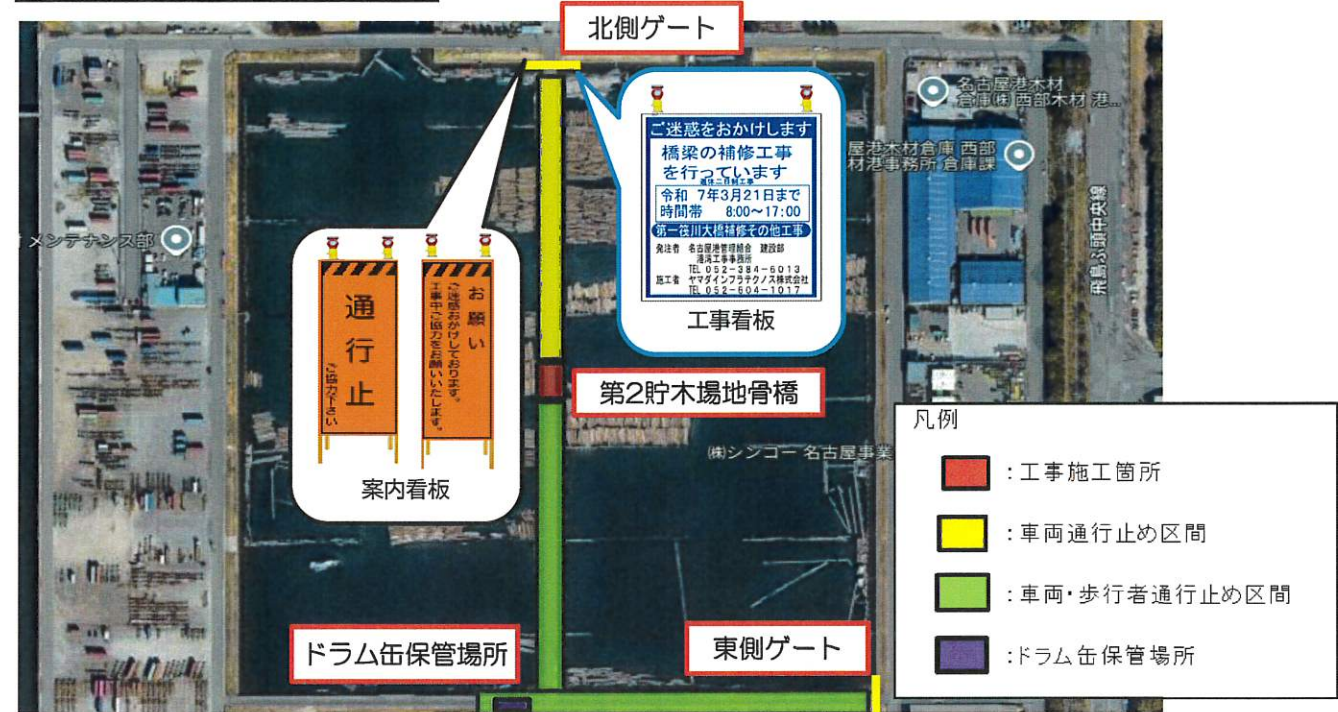

※ 足場資材搬入車両等は北側ゲートを開け、退場時には東ゲートから退場します。

工種・名称	単位	数量	2024年								2025年		備考	
			9月		10月		11月		12月		1月			
			10	20	10	20	10	20	10	20	10	20		
第2貯木場地骨橋														
仮設	仮設工（設置）													吊り足場
	防護工													板張・シート
素地調整	素地調整	m2	152											1種ケレン
	研削材及びケレンかす回収・精込工	m2	152											
塗装	塗装塗り替え工	m2	152											Rc-1塗装系
	仮設工（解体）													
車両通行止め期間														区間
車両・歩行者通行止め期間														区間
ドラム缶保管期間														区間

※天候等により工程に若干のずれが生じる可能性があります。

工事中はご不便をおかけすることがあるかと思いますが、
 何卒ご理解・ご協力をお願いいたします。
